




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
85	GX-B1343/21-9-24029	2024.6.21	1. 矿井总进风量：2170.5m ³ /min，矿井总回风量：2231.0m ³ /min； 2. 主通风机风量：2314.7m ³ /min； 3. 矿井有效风量：1454.1m ³ /min； 4. 矿井有效风量率：62.8%； 5. 通风机负压：864Pa； 6. 矿井通风阻力：838.3Pa。	
86	GX-B1425/23-9-24010	2024.6.21	1. 矿井进风风量：2178.8m ³ /min； 2. 矿井反风风量：1355.5m ³ /min； 3. 机站正常通风风量：2307.9m ³ /min； 4. 机站反风风量：1816.2m ³ /min； 5. 机站反风率：78.69%； 6. 矿井风流反向用时：5 分 23 秒。	

87	GX-B1371/21-9-24023	2024年6月21日	存在问题： 布置图中未标注中心站。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
88	GX-B1371/21-9-24024	2024年6月21日	存在问题： 布置图中风速传感器型号标注错误。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
89	GX-B1376/23-9-24004	2024年6月21日	综合判定：合格。	

90	GX-B1376/23-9-24005	2024年6月21日	综合判定：合格。	
91	GX-B1341/21-9-24128	2024.6.24	综合判定：合格。	
92	GX-B1371/21-9-24028	2024.6.24	存在问题： 1、中心站无声光报警装置； 2、井下总回风巷、各个生产中段的回风巷未设置风速传感器； 3、风速传感器未设置在能准确计算风量的地点； 4、风速传感器未设置报警值； 5、监测监控设备未定期进行调校； 6、未建立台账及报表； 7、主通风机的负压、开停、风速传感器未接入监控系统。 建议：加强传感器日常维护及调校；除上述问题外，其余所检项目合格。	

93	GX-B1371/21-9-24029	2024.5.24	存在问题： 1、井下总回风巷、各个生产中段的回风巷未设置风速传感器； 2、风压、风速、开停传感器未接入监控系统； 3、风速传感器未设置报警值； 4、监测监控设备未定期进行调校； 5、未建立台账及报表； 6、无监测监控系统布置图。 建议：1、监测监控系统布置图用通风系统图作为底图绘制； 2、加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	
----	---------------------	-----------	---	---

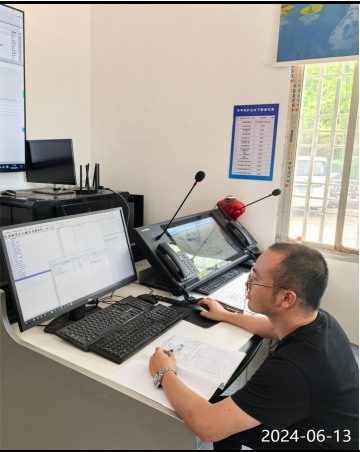
